

DIREZIONE DI PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO

Aggiornamento stato avanzamento PNRR - CM Milano

Commissione Consiliare
07/02/2025



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Progetti PNRR coordinati

■ Piani Urbani Integrati

Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2, finalizzati a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovono la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti e al consumo energetico, per un totale di oltre 277 milioni di euro.

I Piani Urbani di Città Metropolitana di Milano sono Come In, Spugna, Cambio e Mica per un totale di 143 progetti.

- **COME IN**- Spazi e servizi di INclusione per le Comunità MEtropolitane si prefigge di incrementare le politiche di inclusione sui territori metropolitani milanesi attraverso interventi di rigenerazione urbana e di promozione della coesione sociale;
- **SPUGNA** - prevede interventi *Nature Based Solution* come strumento più efficace per ridurre le inondazioni, conservare l'acqua per i periodi di siccità e ridurre l'inquinamento idrico;
- **CAMBIO** - mira a realizzare 5 superciclabili prioritarie del Biciplan di CMM che individua nel suo complesso una rete di 24 corridoi costituenti l'ossatura ciclabile portante dell'intero territorio;
- **MICA** - realizzato dal Comune di Milano in qualità di Soggetto Attuatore, prevede interventi che hanno l'obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili limitando il consumo di suolo edificabile.

Progetti PNRR coordinati

■ Edilizia Scolastica

Il PNRR è una occasione per riqualificare gli istituti scolastici secondari di secondo grado di proprietà della Città metropolitana di Milano. Molti sono gli interventi che sono stati finanziati con fondi ministeriali e successivamente trasformati in fondi PNRR, in particolare sono 26 interventi per un costo complessivo di circa 88 milioni di euro.

A questi vanno ad aggiungersi i progetti che Città metropolitana di Milano ha candidato sugli avvisi PNRR - 10 progetti per un costo complessivo di circa 50 milioni di euro.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Progetti PNRR coordinati

■ PINQuA (Qualità dell'abitare)

Sotto la strategia intitolata “CO4REGENERATION.Collaborare tra generazioni, COabitare nei quartieri metropolitani, COstruire COMunità per la rigenerazione dei territori” sono stati selezionati interventi che riguardano principalmente l’edilizia residenziale pubblica e sociale, il riuso di aree, spazi e immobili pubblici e il miglioramento della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbane, con un’elevata qualità dei progetti sotto il profilo ambientale e con l’adozione di soluzioni ecosostenibili, di efficientamento energetico, di miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici e potenziamento ecosistemico delle aree urbane. Le proposte finanziate sono due e comprendono 22 interventi di rigenerazione urbana. Finanziamento totale: euro 30.000.000,00.

■ Forestazione

La Città Metropolitana di Milano, ha partecipato all’avviso del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 “Tutela e Valorizzazione del Verde Urbano ed Extraurbano” anni 2023-2024 - destinato alla forestazione urbana e periurbana del territorio della Città metropolitana.

Sono stati presentati **2 progetti** che interessano 19 comuni del territorio metropolitano, rispettivamente dal titolo:

- Incrementare il capitale naturale per rafforzare la rete ecologica territoriale;
- La forestazione urbana per mitigare le isole di calore.

Entrambi gli interventi sono stati ammessi a finanziamento per un totale di euro 2.688.257,00.



Progetti PNRR coordinati

■ **Transizione Digitale**

M1C1-1.4.2 - Citizen Inclusion: obiettivo di migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici digitali attraverso la diffusione di strumenti e strategie condivise: da test di usabilità ed accessibilità, ad attività di comunicazione e disseminazione passando per lo sviluppo di kit dedicati. Finanziamento totale della misura pari a euro 650.720,000. Scadenza: conclusione dei lavori entro aprile 2025;

M1C1-1.4.4 - Adozione identità Digitale: finanziamento retroattivo fino al febbraio 2020, la Città metropolitana ha chiesto il finanziamento per attività di integrazione già svolte. L'Avviso DTD prevedeva l'obbligo di svolgere un corso di formazione sul protocollo OIDC dedicato al personale tecnico della CMMi. Finanziamento totale pari a euro 14.000,00 (finanziamento *lump sum*). Scadenza: 10/07/2026;

M1C1-1.4.5 - Comprehensive Cybersecurity Città metropolitana di Milano: implementazione del grado di cybersicurezza dell'Ente, mediante acquisizione di apparati Hardware dedicati alla cybersecurity, di formazione specialistica, di servizi di gestione del rischio Cyber e di sicurezza delle applicazioni, dei dati e delle reti. Finanziamento totale pari a euro 1.495.598,00 (Iva 22% inclusa). Scadenza: 31/12/2025.



Progetti PNRR coordinati

■ CPI (centri per l'impiego)

Il Piano di potenziamento dei centri per l'impiego ha come obiettivo quello di realizzare nuove sedi distaccate di Cpi in città entro il 2025 per ridisegnare un sistema di servizi del lavoro innovato, in grado di fornire risposte di qualità e in tempi rapidi alle sfide del mercato, di comunicare efficacemente con gli altri servizi, con i cittadini e con le imprese, garantendo anche l'aumento della capillarità nell'erogazione dei servizi.

Sono previste tre linee di intervento:

Area 1. Osservatorio	90.000,00 €
Area 2. Sistemi informativi	387.168,23 €
Area 3. Interventi strumentali e infrastrutturali	19.000.000,00 €
TOTALE	19.477.168,23 €




I NUMERI DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO NEI PROGETTI PNRR

215
CUP


464
milioni
di euro

PROGETTI PNRR SVILUPPATI




- PUI
- EDILIZIA SCOLASTICA
- QUALITA' DELL'ABITARE
- FORESTAZIONE
- TRANSIZIONE DIGITALE
- CENTRI PER L'IMPIEGO

STANZIAMENTI



- PUI
- EDILIZIA SCOLASTICA
- QUALITA' DELL'ABITARE
- FORESTAZIONE
- TRANSIZIONE DIGITALE
- CENTRI PER L'IMPIEGO

STATO AVANZAMENTO LAVORI



- PROGETTAZIONE
- LAVORI AGGIUDICATI
- CANTIERI APERTI
- LAVORI FINITI

Aggiornamento normativo

- 2 marzo 2024 - è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.L. n. 19/2024** (conv. in L. 56/2024) avente ad oggetto «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» attraverso il quale sono stati individuati in via definitiva (All. 2) i progetti a valere sul PNRR e quelli (All. 3) che non concorrono al conseguimento di M&T di misura e integralmente finanziati sulle risorse di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 19 del 2024 (PNC);
- 5 agosto 2024 - il DAIT (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) ha pubblicato le istruzioni per la presentazione della **rendicontazione delle spese per il personale esterno** assunto a tempo determinato a supporto dei progetti PNRR;
- 8 agosto 2024 - il DAIT ha precisato di aver concluso le **operazioni di pagamento** per i Progetti afferenti ai Piani Urbani Integrati, relativamente all'integrazione degli acconti e/o delle somme dei rendiconti di progetto in ReGiS secondo quanto previsto dal D.L. 19/2024 (conv. In L. 56/2024);
- 6 dicembre 2024 - il MEF ha emanato il decreto attuativo che semplifica le procedure per l'erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, rendendo più rapidi e snelli i processi di pagamento. In base al Decreto, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle risorse finanziarie ai Soggetti Attuatori, fino alla soglia complessiva del 90% del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Viene previsto un **controllo di regolarità formale delle richieste a campione**, venendo meno i controlli *ex ante* inizialmente previsti ai fini dell'erogazione delle ulteriori risorse.



Stato di attuazione PUI Come In

- ✓ **Aggiudicazione** → tutti i **34 CUP aggiudicati entro il 30 luglio 2023**, nel rispetto della prima milestone assegnata;

Al **30 settembre 2024**, milestone italiana intermedia che imponeva la realizzazione di una percentuale almeno pari al 30% degli stati di avanzamento dei lavori (SAL), dei 30 Comuni finanziati con fondi PNRR:

- ✓ 23 hanno completato la rendicontazione del 30% rispettando la milestone;
- ✓ 7 hanno compilato una dichiarazione in cui si impegnano a raggiungere il target finale di giugno 2026. (la FAQ 27 del DAIT prevede che il superamento temporale della Milestone non comporti un definanziamento a condizione che il Soggetto Attuatore confermi la conclusione dell'opera al 30 giugno 2026);
→ Il Target Q4 24 T-ITA relativo alla milestone del 30 settembre 2024 riguarda esclusivamente i progetti che risultino finanziati o cofinanziati da risorse PNRR.

Al **31 dicembre 2024**:

- ✓ **28 cantieri aperti**
- ✓ **4 progetti coperti con risorse nazionali**, come da D.L. 19/24, essendo il termine dei lavori spostato dopo il 30 giugno 2026 a seguito di richiesta dei Soggetti Attuatori
- ✓ **2 interventi conclusi e inaugurati** (Bresso e Segrate).

È stato effettuato circa il 60% dei sopralluoghi nei cantieri del **PUI Come In**



Segrate



Bresso



Legnano



Sedriano



Pero



Paderno Dugnano



Pieve Emanuele



Vizzolo Predabissi



Stato di attuazione PUI Spugna

✓ **Aggiudicazione** → tutti i **90 CUP aggiudicati entro il 30 luglio 2023**, nel rispetto della prima milestone assegnata

Al 30 settembre 2024 → milestone rispettata per tutti i CUP con realizzazione del 33,5% dei lavori.

Al 31 dicembre 2024:


- ✓ **27 cantieri aperti**
- ✓ **25 interventi conclusi**



Stato di attuazione PUI Spugna



CORMANO - Via Brodolini area disperdente NBS

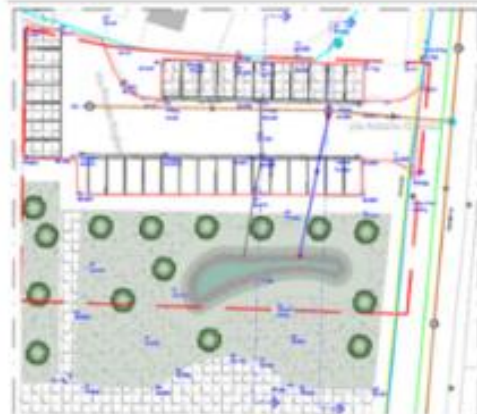

OPERA VIA GRAMSCI - area disperdente NBS



SEGRATE - VIA Mondadori - BACINO DETENZIONE NBS



Cesano B. - Via delle Acace



Artuno - piazza De Gasperi



Solaro - Piazza Grandi



Stato di attuazione PUI Cambio

- ✓ **Aggiudicazione** → tutti i **5 CUP aggiudicati entro il 30 luglio 2023**, nel rispetto della prima milestone assegnata;

Titolo	Importo PNRR	Fondo opere indifferibili	IMPORTO TOTALE OPERA
LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO	1.467.856,00	211.733,81	1.679.589,81
LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO	14.100.000,00	3.472.553,10	17.572.553,10
LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO	13.450.000,00	3.014.011,51	16.464.011,51
LINEA N.12 BICIPLAN CAMBIO	10.500.000,00	1.612.062,20	12.112.062,20
LINEA N.15 BICIPLAN CAMBIO	10.549.999,99	1.625.672,52	12.175.672,51



Stato di attuazione PUI Cambio

Linea 2

Consegna lavori: 25/10/2023

Stipula contratto: 29/01/2024

Avanzamento lavori al 50%

Il tratto a Sesto San Giovanni è finito.

A Cinisello Balsamo è terminata la tratta tra il sottopasso dell'A4 e Monza e dovrà essere avviata la tratta in via Cantù.

Linea 5:

Consegna lavori: 22/12/2023

Stipula contratto: 14/03/2024

Avanzamento lavori al 20%

I lavori continuano a Melzo e Pozzuolo Martesana in corrispondenza delle due passerelle. La passerella di Melzo verrà varata a febbraio sulla SP13. Ci sono delle varianti in corso sul tracciato per risolvere delle criticità (un ricorso chiuso, un'opposizione di BreBeMi a vendere delle aree, Comuni che non hanno ancora firmato l'accordo)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione PUI Cambio

Linea 7

Consegna lavori: 22/12/2023

Stipula contratto: 01/03/2024

Avanzamento lavori al 40%

I lavori sono in corso a Mediglia. E' stata varata la passerella ciclabile sulla SP39. Sono quasi terminati ca 3 km tra Peschiera/Linate e si stanno avviando i lavori per altri 3 km.

Sono partiti i lavori lungo la vecchia Paullese tra Mediglia e Paullo.



Linea 12:

Stipula contratto: 19/06/2024

Consegna lavori: 24/06/2024

Avanzamento lavori allo 0%

Lavori e aree sono stati consegnati, ma l'appaltatore non ha ancora avviato i cantieri lamentando la difficoltà di reperire imprese in subappalto. E' iniziata la cantierizzazione ad Albairate e restano le difficoltà dell'impresa appaltatrice che ha dei procedimenti lunghi e farraginosi che compromettono il rispetto dei tempi PNRR.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione PUI Cambio

Linea 15

Stipula contratto: 22/12/2023

Consegna lavori: 28/03/2024

Avanzamento lavori al 5%

Consegnate le aree, a meno da quelle da espropriare che sono in corso di acquisizione. A metà giugno è iniziata la cantierizzazione a Rho che sta andando a rilento ed è ferma per problemi di terreni inquinati e mancanza di subappaltatori per finire le diverse lavorazioni.

È stata avviata la cantierizzazione a Pero/incrocio Milano, ma non ha avuto corso.

I lavori stanno iniziando con lentezza a Nerviano e a Legnano.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione PUI Mica

- ✓ **Aggiudicazione** → tutti i **6 CUP aggiudicati entro il 30 luglio 2023**, nel rispetto della prima milestone assegnata, **8 CUP** che hanno ricevuto proroga da parte del Ministero della milestone a gennaio 2024 ad oggi risultano aggiudicati.

Al 31 dicembre 2024 **tutti i 14 cantieri risultano aperti**.

Considerata la specificità di realizzazione di alcuni interventi, a seguito dell'entrata in vigore del DL. 19/2024 e di successivo confronto con il Ministero, per 4 interventi è stato deciso lo spostamento verso la copertura finanziaria di risorse nazionali, escludendoli dal target nazionale e prorogando il termine di realizzazione al 31 dicembre 2026.



Stato di attuazione **Edilizia scolastica**

Fonti di finanziamenti	N. Opere	Importo complessivo opere
Progetti "in essere"	26	88.551.538,94 €
Progetto FUTURA	10	50.215.160,00 €
TOTALE	36	139.366.698,94 €



Stato di attuazione Edilizia scolastica

Al 31 dicembre 2024, per **13 CUP** i lavori sono terminati per un totale di euro 13.357.000,00:

Comune	Istituto	Lavoro	Importo opera
Legnano	Dell'Acqua	Recupero palestra	300.000,00 €
Legnano	Bernocchi	Serramenti	2.632.000,00 €
Legnano	Bernocchi	Torneria	210.000,00 €
Parabiago	Maggiolini	Coperture e blocchi bagni delle palestre	210.000,00 €
Rho	Rebora	Ristrutturazione spazi didattici	1.650.000,00 €
Milano	Frisi	Messa in sicurezza	650.000,00 €
Milano	Galilei- Tito Livio	Sistemazione aule	700.000,00 €
Milano	Kandinsky	Serramenti e ripristino facciata	1.700.000,00 €
Milano	Vespucci	Rifacimento coperture	1.500.000,00 €
Milano	Educandato Setti Carraro	Rifacimento coperture	1.755.000,00 €
Arese	Falcone-Borsellino	Coperture e impianti elettrici	600.000,00 €
Paderno Dugnano	Gadda	Infissi e risanamento ambientale	750.000,00 €
Rho	Rebora	Adeguamento normativo	700.000,00 €



Stato di attuazione Edilizia scolastica

Gli altri progetti sono ancora in corso:

Comune	Istituto	Lavoro	Stato lavori	Importo opera
Milano	Verri	Serramenti	90% lavori eseguiti	2.197.041,71€
Milano	Educandato Setti Carraro	Riqualificazione architettonica della mensa	90% lavori eseguiti, fine lavori gennaio 2025	545.300,00 €
Legnano	Bernocchi	Adeguamento normativo	80% lavori eseguiti	10.384.000,00 €
Rho	Rebora	Nuova palestra	80% lavori eseguiti	2.350.000,00€
Milano	Pareto	Adeguamento sismico + efficientamento energetico	80% lavori eseguiti	7.803.000,00 €
Milano	Conti-Veneto	Riqualificazione energetica	82% lavori eseguiti	5.000.000,00 €
Tutti	Diversi istituti	Manutenzione straordinaria	70% lavori eseguiti	9.619.920,00 €
Arese	Russell	Nuovo corpo aule	73% dei lavori, Fine prevista il 4 aprile 2025	3.110.250,77 €
Tutti	Diversi istituti	Manutenzione straordinaria impianti elevatori	60% lavori eseguiti	2.200.000,00€
San Donato Milanese	Centro scolastico San Donato	Riqualificazione palestra	60% lavori eseguiti	1.620.000,00€



Stato di attuazione Edilizia scolastica

Cernusco sul Naviglio	Majorana	Miglioramento sismico	50% lavori eseguiti	4.561.700,00 €
Milano	Frisi	Costruzione nuova scuola	40% lavori eseguiti. Aprile 2025 fine fase 1 con consegna palazzina e aule	26.400.000,00 €
Milano	Russell	Nuove aule	40% lavori eseguiti	2.200.000,00 €
Milano	Schiapparelli Gramsci	- Miglioramento strutturale e efficientamento energetico	26% lavori eseguiti	2.400.000,00€
Milano	Leonardo Da Vinci	Riqualificazione energetica dell'involucro trasparente	26%	816.860,00 €
Tutti	tutti	Manutenzione straordinaria servizi igienici	20% lavori eseguiti	6718427,10 €
Milano	Puecher	Aree all'aperto per attività sportive	20% lavori eseguiti	930.000,00 €
Cassano d'Adda	Giordano Bruno	Nuova palestra	8% lavori eseguiti (problemi con impresa in via di risoluzione)	2.350.000,00 €
Milano	Vespucci	Nuovo corpo aule con palestre	4% lavori eseguiti	11.184.823,38 €
Milano	Giorgi	Lavori di ampliamento	2% lavori eseguiti	14.456.559,53 €
Tutti	Diversi istituti	Impianti tecnologici	Avvio lavori a gennaio 2025	4.022.067,22€
Milano	Feltrinelli	Capannoni e laboratori	Inizio lavori gennaio 2025	3.800.000,00€
Tutti	Diversi istituti	Manutenzione straordinaria di impianti riscaldamento/ventilazione	Approvazione progetto entro gennaio 2025	1.500.000,00€



Stato di attuazione Edilizia scolastica

Gli altri progetti sono ancora in corso:



Dell'Acqua di Legnano – recupero palestra



Bernocchi di Legnano – torneria



Olmo di Cornaredo - efficientamento energetico



Vespucci di Milano – rifacimento coperture



Falcone Borsellino di Arese - Coperture e impianti elettrici



Galilei di Milano
Recupero laboratori e rifacimento coperture



Gadda di Paderno Dugnano
Infissi e risanamento ambientale



Rebora di Rho – Ristrutturazione spazi didattici



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di Attuazione PINQuA



Interventi	Quota PNRR	Co-finanziamento dei Comuni	Fondo opere indifferibili	Totale costo interventi
22	€ 29.999.505,00	€ 4.072.970,71	€ 5.706.587,94	€ 39.779.063,65

Aggiudicazione → tutti i **22 CUP**

Al 31 dicembre 2024:

- ✓ **3 risultano ultimati in attesa di CRE/Collaudò;**
- ✓ **7 cantieri sono aperti e attivi con conclusione prevista entro il 31/03/2026;**
- ✓ **12 cantieri sono aperti e attivi con conclusione prevista entro il primo semestre del 2025.**

Erogazioni:

- ✓ per 20 interventi è stata erogata un'anticipazione pari al 30% del finanziamento PNRR;
- ✓ per 2 interventi è stata erogata un'anticipazione pari al 10% del finanziamento PNRR, dato che i due comuni non hanno richiesto l'ulteriore anticipazione.

Prossima milestone al 31/03/2026: conclusione di tutti gli interventi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di Attuazione PINQuA

Nel secondo semestre 2024 sono stati effettuati sopralluoghi nel 60% dei cantieri di cui si riportano le relative immagini



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Città
metropolitana
di Milano


Stato di attuazione **Forestazione**

2 progetti per 25 aree in 19 comuni

Incrementare il capitale naturale per rafforzare la rete ecologica territoriale

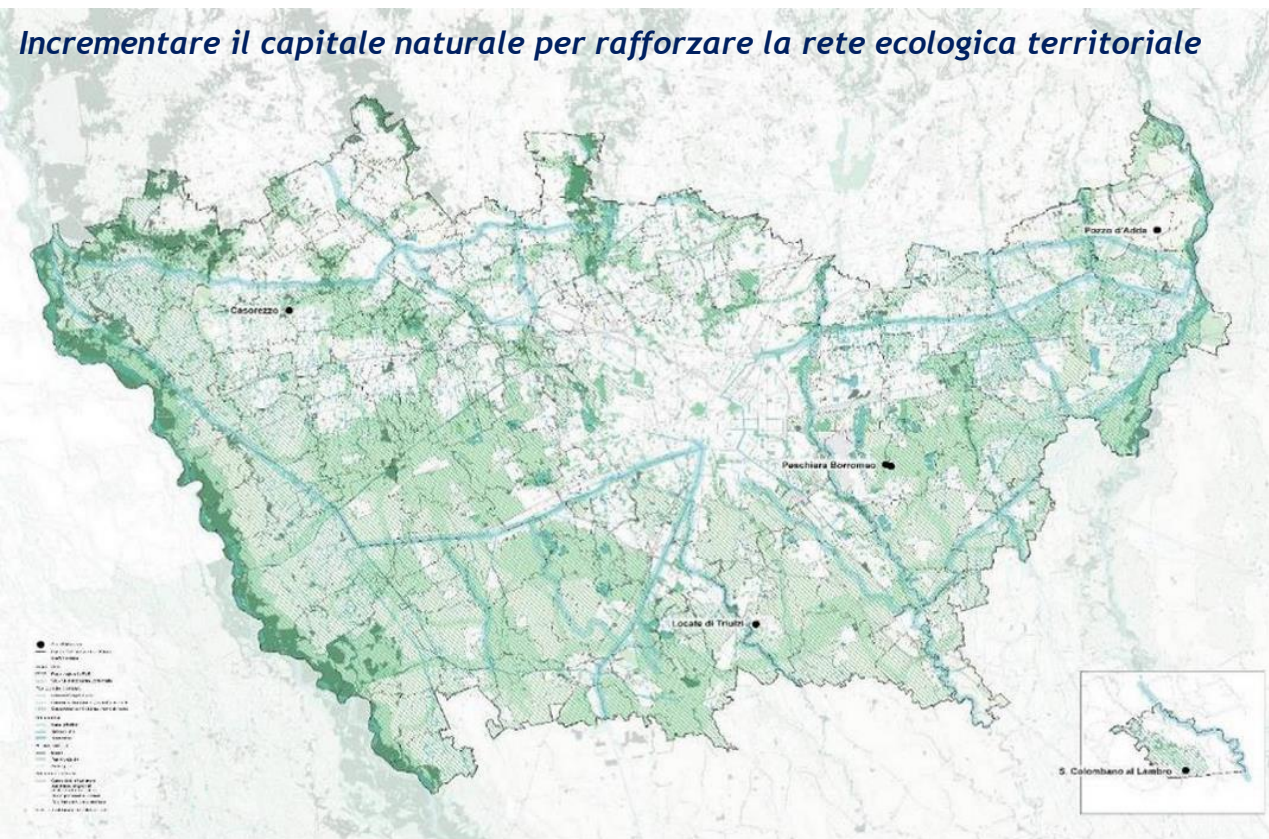

La forestazione urbana per mitigare le isole di calore

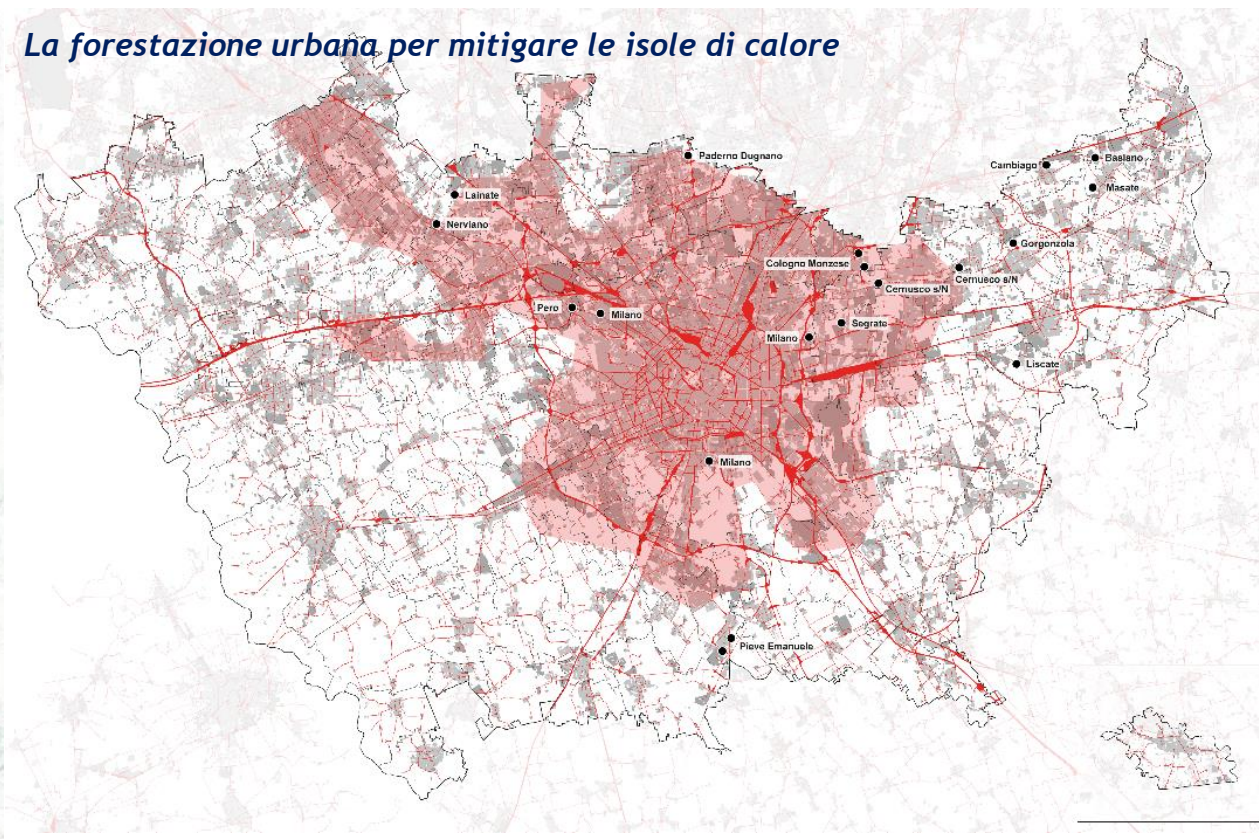

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione **Forestazione**

- ✓ **Al 30 Settembre 2023:** candidatura di entrambe le proposte progettuali al MASE
- ✓ **Al 30 Dicembre 2023:** Decreto Ministeriale n. 606/23 di ammissione finanziamento
- ✓ **Agosto-Settembre 2024:** i progetti sono stati oggetto di Conferenza di Servizi conclusasi con esito positivo
- ✓ **Ottobre 2024:** sono stati approvati i progetti di Fattibilità Tecnico-economica
- ✓ **Dicembre 2024:** sono stati approvati i progetti esecutivi. **Al 10 dicembre 2024**, per entrambi i progetti, è stato rispettato il Target assegnato dalla Misura del PNRR, e pertanto sono state ultimate le operazioni di *Planting* (messa a dimora della piante in vivaio) presso il Vivaio ERSAF, con il quale è stato contrattualizzato l'acquisto della fornitura di piante.
Il raggiungimento del Target è stato caricato e rendicontato sulla piattaforma di controllo e monitoraggio REGIS;
- ✓ Entro i prossimi mesi si procederà con la fase di aggiudicazione dei lavori per entrambi gli interventi e potranno avere avvio le operazioni di *Transplanting* nelle singole aree individuate dal progetto e, ultimati i lavori di messa a dimora del materiale forestale, le attività proseguiranno per un periodo di 5 anni, che prevede le cure colturali e il monitoraggio degli impianti realizzati.



Stato di attuazione **Forestazione**

Si riporta la documentazione fotografica della messa a dimora delle piante (Planting) presso i Vivai Ersaf



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione **Transizione digitale**

Aggiudicazione → **1 CUP aggiudicato** (misura M1C1-1.4.2 - Citizen Inclusion - miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali) Firma dell'Accordo con AGID il 29/01/2024.

Al 30 giugno 2024:

- ✓ In valutazione i preventivi pervenuti circa la fase di *assessment* per la definizione dei fabbisogni di tecnologia assistiva da acquistare. Prima della firma dell'Accordo sono stati acquistati hardware e software di supporto all'attività lavorativa del personale non vedente e ipovedente del centralino telefonico: è in valutazione la possibilità di far rientrare questo acquisto nel finanziamento, essendo finanziabili spese sostenute fino al Febbraio 2020;
- ✓ Servizio di *assessment* e di erogazione corsi in fase di aggiudicazione a CSI Piemonte per un importo di € 96.416,63 nel 2024 ed € 15.000,00 nel 2025;
- ✓ Servizio aggiudicato (Det. 4476 del 30/05/2024) con un importo pari a € 56.120,00 (IVA 22% inclusa).

Entro il 30 aprile 2025

- Conclusione delle attività da contratto entro il 31/01/2025.



Stato di attuazione **Transizione digitale**

✓ Al 31 dicembre 2024:

1) M1C1-1.4.2 - Citizen Inclusion:

- L'Accordo con AGID (soggetto attuatore) è stato firmato il 29/01/2024;
- Prima della firma dell'Accordo sono stati acquistati hardware e software di supporto all'attività lavorativa del personale non vedente e ipovedente del centralino telefonico;
- L'erogazione della formazione è in corso sia per il personale di Città metropolitana che per il personale dei Comuni aderenti;
- E' stata inviata a luglio ad AGID l'attestazione ex-ante con la tipologia di errori di accessibilità dei servizi online indicato nel Progetto. Da contratto, le attività di correzione tipologie di errori e successivo invio attestazione ex-post, si concluderanno entro il 31/01/2025.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione **Transizione digitale**

✓ Al 31 dicembre 2024:

✓ 2) M1C1-1.4.4 - Adozione identità Digitale

- Integrazione SPID/CIE conclusa;
- Corso di formazione OI DC: affidato ad Ancilab srl per un importo pari a 600€ (Det. n. 223 del 18/03/2024), Atto di liquidazione n. 4379 del 27/05/2024;
- È stata caricata la richiesta di erogazione finanziamento sulla piattaforma PA Digitale 2026 in data 5/07/2024 e si trova in fase di verifica da parte del DTD. Attualmente si è in attesa di riscontro dell'istruttoria e del finanziamento da parte del DTD;
- Scadenza: 10/07/2024 (termine per richiesta erogazione finanziamento).



Stato di attuazione **Transizione digitale**

✓ Al 31 dicembre 2024:

3) M1C1-1.4.5 - Comprehensive Cybersecurity Città metropolitana di Milano:

- Comunicazione ad ACN di avvio attività e contestuale richiesta di erogazione dell'anticipazione del finanziamento per l'importo di € 149.559,80 (Iva 22% inclusa);
- Valutazione di preventivi relativi all'acquisizione dei servizi di Assesment, Security Training, Certificazione ISO 27001 e all'acquisto mediante Accordo quadro/convenzione Consip dell'apparato Firewall;
- Progettazione della procedura negoziata senza bando per l'acquisizione dell'apparato anti DDoS, del sistema Log Analyzer Firewall e dei relati vi servizi di configurazione;
- Scadenza: 31/12/2025.

Stato di Attuazione CPI

Area 3. Interventi infrastrutturali

L3.1 CPI Milano sede principale –V.Strozzi	4.778.111 €
L3.2 CPI Milano sedi decentrate - Comune di Milano	5.071.460 €
L3.3 CPI Comuni metropolitani	4.634.647 €



Stato di Attuazione CPI

1. Gli interventi di Milano - via Strozzi 9/11 - proprietà immobiliare CMM

	Valore economico	Stato avanzamento al 06/12/2024
CPI Milano – Via Strozzi,9/11 (lavori esterni) APPROVATA	2.678.111,00 €	Schede progetto (num.3) presentate e approvate dal Nucleo di valutazione di Regione Lombardia.
CPI Milano – Via Strozzi, 9/11 (lavori interni) APPROVATA	1.200.000,00 €	
CPI Milano – Via Strozzi , 9/11 (lavori palazzina 2 Servizio occupazione disabili) APPROVATA	900.000,00 €	Elaborazione di Documenti di indirizzo della progettazione.
	4.778.111,00	Affidamento da parte del RUP – arch. Barbara Canova di Città Metropolitana di Milano – ai progettisti per la predisposizione dei tre Progetti di fattibilità tecnico economica (PFTE). In corso di definizione il testo della Convenzione che verrà riformata tra Regione Lombardia e Città metropolitana di Milano.



Stato di Attuazione CPI

2. Interventi CPI Milano - sedi decentrate - proprietà immobili Comune di Milano.
Risorse PNRR - progetti in essere (Soggetto attuatore Comune di Milano)

	Valore economico	Stato avanzamento al 06/12/2024
CPI Milano – Via Parea , 13 (sede distaccata) APPROVATA	138.000,00 €	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione Convenzione RL, CMM e Comune da riformare entro l'anno; 2. Richiesta parere formale a Regione Lombardia in merito spese straordinarie degli immobili di proprietà del Comune di Milano ; 3. Completamento PFTE per tutte le cinque sedi; 4. Avvio e completamento dei lavori di ristrutturazione della sede di V.le Jenner la cui apertura è prevista nei primi mesi 2025;
CPI Milano – Paravia, 26 (sede distaccata) APPROVATA	384.000,00 €	
CPI Milano – Carchidio,2 (sede distaccata) APPROVATA	3.900.000,00 €	
CPI Milano – Jenner, 54 (sede distaccata) APPROVATA	324.000,00 €	
CPI Milano - Boifava (sede distaccata) APPROVATA	325.460,00 €	
	5.071.460,00 €	



Stato di Attuazione CPI

3. Interventi CPI fuori Milano (Soggetti attuatori i comuni interessati)

	Valore economico	Stato avanzamento al 06.12.24
CPI Magenta (sede da identificare) RINUNCIA	800.000 €	
CPI Magenta (sede da identificare) RINUNCIA	250.000 €	RINUNCIA
CPI Corsico, Via Leonardo Da Vinci, 5 (sede attuale CPI- proprietà comunale) RINUNCIA	800.000 €	RINUNCIA
CPI Cinisello Balsamo, Via Martinelli 23 (nuova sede proprietà comunale- CPI attualmente in via Gorki, 65) PRESENTATA	325.000 €	Presentazione a Regione Lombardia: Descrizione intervento, scheda tecnica, cronoprogramma e quadro economico. In attesa di approvazione da parte del Nucleo di valutazione
CPI Rho, Villafranca 8 (sede attuale proprietà comunale) APPROVATA	429.000 €	In fase di elaborazione il Progetto fattibilità tecnica economica. Predisposizione testo della Convenzione tra RL CMM e Comune di Rho. Comune di Rho è stazione appaltante qualificata PNRR gestirà in autonomia gara appalto.
CPI Rozzano, Via Matteotti, 33/35 (sede attuale – proprietà comunale) APPROVATA	649.647 €	Il Comune di Rozzano si è convenzionato con la Stazione unica appaltante di CMM/MB. In fase di avvio gara per affidamento lavori di ristrutturazione.
CPI Pioltello, Via Ugo La Malfa, 2 (sede distaccata CPI Melzo – proprietà ALER) PRESENTATA	216.000 €	Presentazione a Regione Lombardia: Descrizione intervento, scheda tecnica, cronoprogramma e quadro economico. In attesa di approvazione da parte del Nucleo di valutazione.
CPI Abbiategrasso, P.zza Vittorio Veneto, 7 (sede distaccata CPI –Magenta- proprietà comunale) APPROVATA	1.670.000 €	In fase di elaborazione il Progetto fattibilità tecnica economica. Predisposizione testo della Convenzione tra RL CMM e Comune di Abbiategrasso.
CPI Bollate, via Tito Speri, 14/18 (distaccata di CPI Rho- proprietà comunale) APPROVATA	220.000 €	In fase di elaborazione il Progetto fattibilità tecnica economica. Predisposizione testo della Convenzione tra RL CMM e Comune di Bollate.
	3.509.647 €*	*Esclusi gli interventi per i quali è stata presentata rinuncia



Stato di Attuazione CPI


4. Interventi trasversali

		Valore economico	
ARREDI (TUTTI I CPI)	APPROVATA	1.553.074 €	Gare gestite direttamente da CMM
ARREDI (AUDITORIUM VIA STROZZI)	APPROVATA	415.749 €	
STRUMENTAZIONE INFORMATICA (TUTTI I CPI)	APPROVATA	375.500 €	
STRUMENTAZIONE INFORMATICA (TUTTI I CPI)	APPROVATA	186.220 €	
TELEFONIA MASTRILLI	APPROVATA	224.926 €	
STRUMENTAZIONE AUDIOVIDEO	PRESENTATA	1.378.356 €	



Sintesi dei target

PUI (Comeln, Spugna, Cambio, MiCa)



Edilizia Scolastica



Qualità dell'abitare



Forestazione



Transizione Digitale



Centri per l'impiego



Conclusioni

Attualmente si rileva un **passaggio di fase: dalla progettazione/appalto lavori alla conclusione/rendicontazione dell'intervento** che ha reso necessario rinforzare sia la fase di presidio della realizzazione fisica delle opere sia, in particolare, l'implementazione delle procedure di rendicontazione/rimborso finanziario e delle attività di controllo e attestazione in ordine ai principi e criteri trasversali a tutto il PNRR (es. rispetto DNSH, conflitto d'interessi, assenza doppio finanziamento, ecc.).

→ Pertanto CMM ha ritenuto di predisporre un **supporto esterno specialistico a tutela dell'Amministrazione e a garanzia della conferma dei finanziamenti assegnati a valle dei controlli e delle convalide** che interverranno sia a livello delle amministrazioni ministeriali responsabili delle singole misure di finanziamento, che del sistema di controllo delle competenti strutture della U.E.
